



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§165

Dnr KS 2012-567

**Slutredovisning avseende Investeringens ärende vatten- och
avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012
Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12012 avseende projekt vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012

Sammanfattning av ärendet

Utbyggnaden av VA-ledningsnätet i Bergshamra har utförts enligt med Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-07. Projektet innefattar överföringsledningar från Sjöändan till Bergshamra reningsverk samt utbyggnad av VA-ledningar i områdena Enviken, Bergshamra by och Bergshamra tätort. Kostnaden för arbetet uppgår till 232 000 tkr. Budget var 225 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av Investeringens ärende vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012

Bilaga 1. Slutrapport

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Verksamhetssamordnare VA
Norrtälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden

Paragrafen är justerad



Norrtälje Vatten och avfall

Handläggare: Peter Leonardsson
Titel: Projektledare
E-post: peter.leonardsson@nvaa.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investeringsärende vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12012 avseende projekt vatten- och avloppsledningar till Bergshamra, projekt 12012

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Utbyggnaden av VA-ledningsnätet i Bergshamra har utförts enligt med Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-07. Projektet innefattar överföringsledningar från Sjöändan till Bergshamra reningsverk samt utbyggnad av VA-ledningar i områdena Enviken, Bergshamra by och Bergshamra tätort. Kostnaden för arbetet uppgår till 232 000 tkr. Budget var 225 000tkr.

Ärendet

Beskrivning

Norrtälje kommun antog den 26 september 2011 ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för åren 2010-2030. Bergshamra samhälle hade tidigare egen VA-försörjning genom två vattenverk och ett avloppsreningsverk. I anslutning till samhället fanns bebyggelseområden med behov av ordnad VA-försörjning. Dessa områden var Bergshamra by, Enviken och ett område i östra delen av samhället som benämns som centrala Bergshamra.

Kommunfullmäktige tog den 7 maj 2012 § 101 beslut om utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Bergshamra. Man anvisade också 202 730 tkr för utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområdet inklusive en överföringsledning från Sjöändan till befintligt avloppsreningsverk. Ett tilläggsanslag beslutades om 16 december 2019 § 292 på 22 200 tkr. Sammanlagd budget för hela projektet har därmed varit 224 950 tkr.

I projektet har följande delprojekt ingått

1. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Envikens fritidsområde som omfattar ca 474 fastigheter.
2. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra by. Inom området bedömdes det finnas ca 124 fastigheter. Projekt 3 har inom detta område svarat för utbyggnad av ledningsnätet i området öster om Bergshamraån.
3. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra tätort.
4. Utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Bergshamra reningsverk och Issjö-Sjöändan.

5. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i den östra delen av vägen uppemot väg 276 (Bergshamra centralt).

Utöver dessa projekt har även en ny tryckstegringsstation byggts för Enviken efter det att projekt nr 1 färdigställts. Ett projekt har också genomförts avseende förnyelse av befintliga vatten- och spillvattenledningar i del av Bergshamra samhälle och har utförts av Veolia Vatten AB under 2013.

Projekt nr 1 slutredovisades den 4 april 2016 till en kostnad på 76 879 tkr och projektet nr 3 och 4 slutredovisades den 17 januari 2019 till en kostnad på 55 639 tkr.

Arbetet med utbyggnaden av såväl Bergshamra by och Bergshamra centralt, projekt 2 och 5, påbörjades under 2012 med utredningar och förstudier. Arbetet slutfördes inte utan en omstart skedde 2017 och utbyggnadsarbetena blev färdigställda 2021.

Kostnader som kommer att tillkomma efter slutrapporten har lämnats in är:

- Kostnaderna för att få rådighet till mark för pumpstation Bergshamra by
- Slutfaktura för återställningsarbeten
- Lantmäteriförrättningar
- LTA-pumpstationer

Lagkrav

VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att skyndsamt bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut tagits om utökning av verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige tog beslut 2012 om utbyggnaden av VA-verksamhetsområdet i Bergshamra.

Koppling till gällande styrdokument

Projektet ingår som en del i den beslutade VA-planen för Norrtälje kommun samt Mål och budget för Norrtälje kommun

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Kostnaden för hela Bergshamraprojektet 2012 är 232 000 tkr och budgeten uppgick till 224 000 tkr, vilket innebär ett överskridande på ca 3%.

Totala kostnaden för Bergshamraprojektet 2021-08-31

	Objekt	Kostnad	Prognos/budget KF-beslut 2019	Avvikelse %
Utredning Bergshamra/överföringsledning	4233	59 947 978		
Förnyelse av VA-ledningar		8 130 035		
Pst ÅN	4237	616 542		
Totalt Utredning /överföringsledningar (projekt 3 och 4)		68 694 555	59 423 000	16
Bergshamra centralt (projekt 5)	4240	16 555 408	15 488 000	7
Enviken	4234	80 116 489		
TS Enviken	4241	1 313 466		
Totalt Enviken (projekt 1)		81 429 955	81 892 000	-1
Bergshamra by	4239	63 775 124		
Pst Bergshamra by	4754	1 017 500		
Pst Rörmossen	4756	616 000		
Totalt Bergshamra by (projekt 2)		65 408 624	68 127 000	-4
Totalt Bergshamraprojektet		232 088 541	224 930 000	3

Förvaltningens analys och slutsatser

En uppdaterad budget/prognos redovisades i beslut i kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 292 och kommunfullmäktige gav då ett extraanslag vilket innebar en total budget på 224 950 tkr. Den totala kostnaden för projektet har blivit ca 3% högre, cirka 232 000 tkr kronor. Orsaken till denna ökning beror på det förnyelsearbete som skett av VA-ledningar i Bergshamra tätort och en ombyggnad av avloppspumpstation Ån som inte ursprungligen var budgeterat för i projektet. Kapaciteten i denna station blev otillräcklig och måste byggas till för att klara den nytillkomna bebyggelsen. En tryckstegringsstation för Enviken har också byggts som inte var med i den ursprungliga budgeten då vattenledningstrycket i området blev för lågt för vissa högt belägna hus.

Kostnaden för att bygga ut VA-ledningsnätet i Bergshamra by och Bergshamra tätort är blivit hög, cirka 15 000 kr/m respektive ca 10 000 kr/m. Den höga kostnaden per meter ledning i Bergshamra by beror bland annat på den gamla fastighetsindelningen vilket inneburit stora svårigheter att dra VA-ledningarna på ett kostnadseffektivt sätt. De reglerbara mängderna har varit höga och det har varit kostnader på grund av markföroreningar och tillfällig pumpning av grundvatten under anläggningsarbetena. Att upprätta alla nyttjanderättsavtalen tog också lång tid vilket innebar förseningar i projektet ett halvår och därmed stilleståndsersättningar.

Inom Bergshamra centralt visade det sig vara dåliga markförhållanden och vilket inneburit en hel del spontning och därmed följande merkostnader.

Intäkterna från anläggningsavgifterna täcker inte kostnaderna för att bygga ut ledningsnätet i Bergshamra by och Bergshamra centralt. Dessa intäkter utgörs endast av ca 25-30 % av kostnaderna för att bygga ut VA-ledningssystemet. Vid framtida beslut av utbyggnader av VA-verksamheten för vatten- och avlopp behövs noggranna analyser ske över såväl finansiering, miljömässiga behov och även alternativa lösningar när det gäller teknik och genomförande av utbyggnadsprojekt.

Tidplaner

Ej tillämplig

Tobias Dahlberg
Tf verkställande direktör
Norrhälje vatten- och avfall AB

Per Hellström
Tf VA-chef
Norrhälje vatten- och avfall AB

Bilagor

Bilaga 1. Slutrapport

Beslut skickas till

Verksamhetssamordnare VA
Norrhälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden



NORRTÄLJE
KOMMUN

Investeringsärende vatten- och avloppsledningar till Bergshamra,

Projekt 12012

Slutrapport

Version: 1.0



Innehåll

1	Inledning.....	3
1.1	Dokumentets användning.....	3
1.2	Referenser.....	3
2	Sammanfattning.....	3
3	Projektbeskrivning.....	3
4	Projektgenomförande.....	4
4.1	Berghamra centralt.....	4
4.2	Bergshamra by.....	7
4.3	Hela Bergshamraprojektet.....	11
5	Måluppfyllelse.....	12
6	Övriga förutsättningar.....	13
7	Vunna erfarenheter.....	13

Revisionshistorik

Version	Beskrivning	Datum	Författare
1.0	Första giltiga version	2021-09-09	Peter Leonardsson
0.3	Rättad	2021-09-03	Peter Leonardsson
0.2	Rättad	2021-09-01	Peter Leonardsson
0.1	Utkast	2021-08-31	Peter Leonardsson



1 Inledning

1.1 Dokumentets användning

Dokumentet är en sammanfattning över vad som genomförts i detta projekt med VA-utbyggnadsområdena Bergshamra by och centralt. Vidare sammanfattas hela projektet Berghamrautbyggnaden, projekt 12012, i och med denna slutredovisning.

1.2 Referenser

Dokument
Investeringsbeslut och utökning av verksamhetsområde KF 2012-05-07 §101
Slutredovisning KF 2016-04-04 § 62 Enviken
Slutredovisning överföringsledning Sjöändan – Bergshamra tätort. KF 2016-10-17 § 200
Tilläggsanslag KF 2019-12-16 §156

2 Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-07 § 101 att utöka verksamhetsområdet för Bergshamra samhälle och anvisade investeringsmedel för utbyggnaden av VA-ledningar samt en överföringsledning mellan Sjöändan och avloppsreningsverket. Projektet har nu genomförts och kostnaderna för arbetet uppgår till 232 mkr och anslagna medel har varit 225 mkr.

3 Projektbeskrivning

Norrtälje kommun antog 2011-09-26 ett program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp för åren 2010-2030. Bergshamra samhälle hade tidigare egen VA-försörjning genom två vattenverk och ett avloppsreningsverk. I anslutning till samhället fanns bebyggelseområden med behov av ordnad VA-försörjning. Dessa områden var Bergshamra by, Enviken och ett område i östra delen av samhället som benämns i rapporten som centrala Bergshamra.

Kommunfullmäktige tog 2012-05-07 § 101 beslut om utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Bergshamra. Man anvisade också 202 730 000 kr för utbyggnad av VA-ledningar inom verksamhetsområdet inkl en överföringsledning från Sjöändan till befintligt avloppsreningsverk. Ett tilläggsanslag beslutades om 2019-12-16 § 292 på 22 200 000 kr. Sammanlagd budget för hela projektet har därmed varit 224 950 000 kr.

I projektet har följande delprojekt ingått



1. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Envikens fritidsområde som omfattar ca 474 fastigheter.
2. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra by. Inom området bedömdes det finnas ca 124 fastigheter. Projekt 3 har inom detta område svarat för utbyggnad av ledningsnätet i området öster om Bergshamraån.
3. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Bergshamra tätort.
4. Utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Bergshamra reningsverk och Issjö-Sjöändan.
5. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i den östra delen av vägen uppemot väg 276. (Bergshamra centralt).

Utöver dessa projekt har även en ny tryckstegringsstation byggts för Enviken efter det att projekt nr 1 färdigställts. Ett projekt har också genomförts avseende förnyelse av befintliga vatten- och spillvattenledningar i del av Bergshamra samhälle. Projektet genomfördes av Veolia Vatten AB under 2013 och kostnaden var 8 130 tkr.

Projekt nr 1 slutredovisades 2016-04-04 till en kostnad på 76 879 tkr och projektet nr 3 och 4 slutredovisades 2019-01-17 till en kostnad på 55 639 tkr.

Arbetet med utbyggnaden av såväl Bergshamra by och Bergshamra centralt, projekt 4 och 5 påbörjades under 2012 med utredningar och förstudier. Arbetet slutfördes inte utan en omstart skedde 2017 och utbyggnadsarbetena blev färdigställda 2021.

4 Projektgenomförande

Något projektdirektiv har inte upprättats för arbetet och inte heller någon projektplan.

4.1 Bergshamra centralt

Ramböll AB har svarat för detaljprojekteringen i området. Kompletterande miljötekniska utredningar har utförts av Trapezia AB.

Riskanalis med förslag till kontrollåtgärder avseende omgivningspåverkan på grund av anläggningsarbetena har upprättats av Bergsäker AB. Företaget har också medverkat med kontroll av omgivningspåverkan under genomförande av arbetet.

SVEFA samt LRF-konsult har biträtt Norrtälje kommun med nyttjanderättavtal med fastighetsägare för att lägga VA-ledningarna i området.

Midkonsult har varit kommunens byggkontrollant på plats under arbetets genomförande.

Beställningsskrivelse för en utförandeentreprenad, AB04, avseende utbyggnad av VA-ledningar i Bergshamra tätort upprättades med Sorex Entreprenad AB 2017-10-24.



Startmöte genomfördes 2017-10-16 och sammanlagt har därefter 15 st byggmöten hållits.

Bjerkning slutbesiktigade arbetena 2018-07-13 och entreprenaden godkändes samma dag. De brister som noterades vid besiktningen är åtgärdade. Garantitiden är 2 år för material och 5 år för utfört arbete.

Ett självfallssystem har byggts för området och sammanlagt har 22 st förbindelsepunkter upprättats. En fastighet tvingas pumpa sitt avloppsvatten på grund av husens höjdläge.

Ledningstyp	
Vattenledningar, meter	1650
Spill, självfallsledningar, meter	1280
Spill, tryckledningar, meter	178
Spillvattenledningar totalt, meter	1458
Förbindelsepunkter	22

Tabell 1 Utfört arbete



Bild 2. Översiktsbild Rörmossevägen

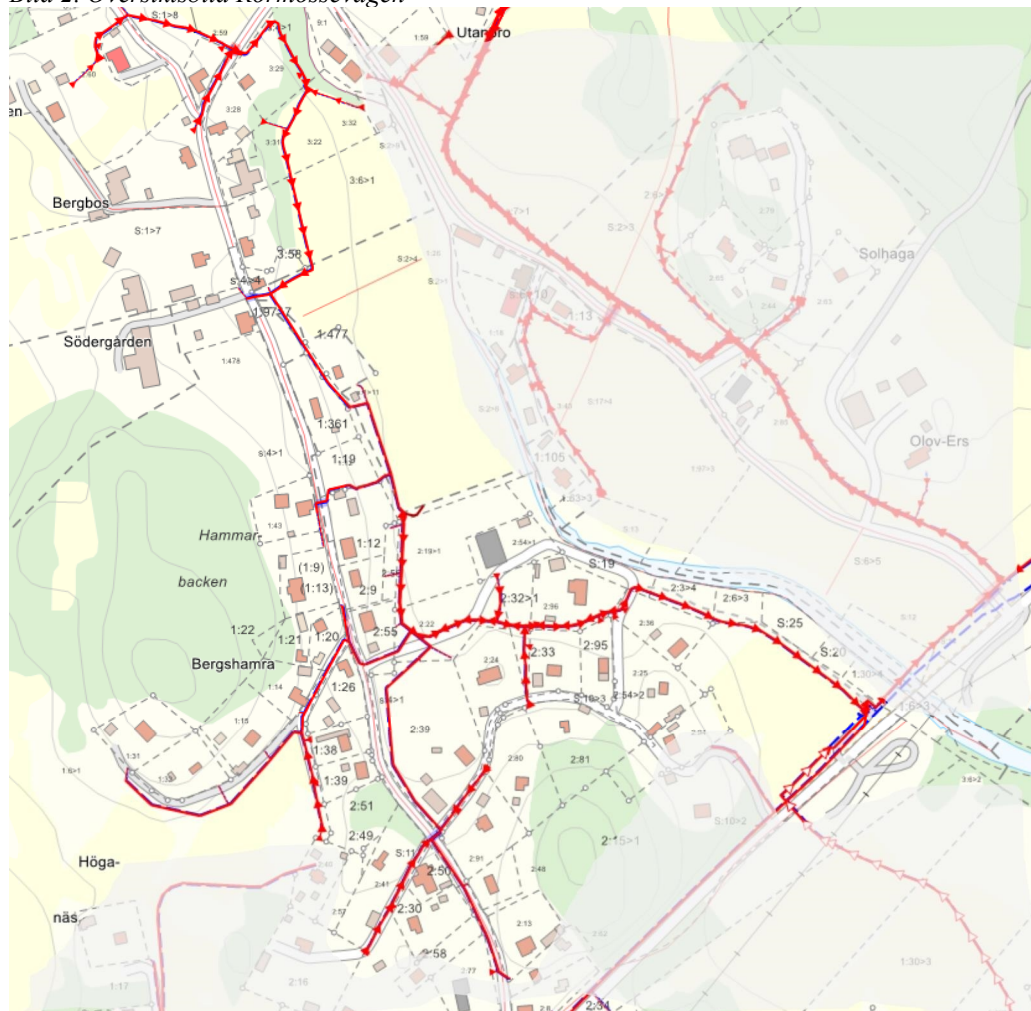


Bild 3. Översiktsbild Bergshamra by

Huvuddelen av fastigheterna har anslutits som LTA-system där varje fastighet fått var sin avloppspumpstation. Där det varit möjligt har självfallssystem byggts. I området har en A-station byggts som har namngivits till Bergshamra by (BHAP14) och en B-station benämnd till Rörmossen (BHAP15). Sammanlagt har 64 förbindelsepunkter upprättats i området.



Ledningstyp	
Vattenledningar, meter	4296
Spill, självfallsledningar, meter	2132
Spill, tryckledningar, meter	2512
Spillvattenledningar totalt, meter	4644
Förbindelsepunkter	64
A-pumpstation	1
B-pumpstation	1

Tabell 3 Utfört arbete

Nyttjanderättsavtal har tecknats med ca 120 fastighetsägare för rättighet att anlägga VA-ledningar inom deras fastigheter. Ansökan om ledningsrätt har sökts för VA-ledningar och pumpstationer hos Lantmäteriet och handläggning pågår på myndigheten med ett troligt offentligt sammanträde innan årsskiftet 2021/2022.

Kostnaden för att genomföra arbetet har uppgått till 65 408 tkr inkl kostnaderna för de två pumpstationerna i området. På detta projektkonto har även 8 130 tkr bokförts för förnyelsearbeten som skett i befintligt nät i Bergshamra samhälle.

Kostnaden per meter uppgår till 15 225 kr (per meter vattenledning). I summan ingår också de kostnader som uppkommit innan omstarten av projektet. Dessa kostnader uppgår till 7 050 tkr.



Kostnadstyp	Kostnader tkr	Kostnad %	Kostnad m vattenledn
Byggherrekostnader	10 141	16	2 361
Marktillgänglighet	2 876	4	670
Entreprenadkostnader	49 630	76	11 553
Övrigt, omföringar	1 127	2	262
Pumpstation Rörmossen	616	1	143
Pumpstation Bergshamra by	1010	2	237
Totalt	65 408	100	15 225

Tabell 4 Kostnader

Kostnaden för att genomföra detta projekt är mycket hög. Orsaken till detta är områdets karaktär. Bergshamra by saknar detaljplan med gamla avstyckningar och har en utspridd bebyggelse samt smala vägar. Det har varit svårt att nå fram med ledningarna till de olika tomterna. Mycket av VA-ledningssystemet ligger därför inte i vägarna utan i fastighetsmark. De reglerbara mängderna har varit högre än vad som beräknats. Det påträffades också markföroreningar vilket innebar höga saneringskostnader. Vidare har också tillfälliga pumpbrunnar monterats för att pumpa grundvatten under anläggningsarbetena.

En fastighet köptes också in i projektet. Tomten blev ej byggbar på grund av de VA-ledningarna som lades på fastigheten. Projektet har blivit försenat 0,5 år på grund av arbetet med alla nyttjanderättsavtalen vilket inneburit stilleståndsersättningar till entreprenören.

Extrakostnaderna som uppkommit på grund av dessa problem bedöms till ca 3 000 tkr

Intäkterna genom anläggningsavgifter är 16 985 tkr (exkl moms). Antalet förbindelsepunkter som upprättats uppgår till 72 st vilket innebär att kostnaden per ansluten fastighet är 908 tkr. Den genomsnittliga intäkten från anläggningsavgiften per fastighet är 236 tkr. Anläggningsavgiften täcker endast upp kostnaden för att bygga systemet till 26 %.

I samband med att överföringsledningen till Sjöändan lades, (objektnummer 4233), anslöts 11 fastigheter öster om Bergshamraån samt 12 fastigheter i området Gustavsberg. Intäkterna från dessa två områden uppgick till 2 235 tkr resp 2 409 tkr.



Projektet Bergshamra by har övertagit och avslutat ett tidigare påbörjat projekt från driftorganisationen avseende en ny tryckstegringsstation intill avloppspumpstationen Ån. Kostnaden för detta projekt är 1 313 tkr.

Kostnaden för att bygga ut VA-ledningsnätet i Bergshamra by och Bergshamra tätort är blivit hög ca 15 000 kr /m respektive ca 10 000 kr/m. Den höga kostnaden per meter ledning i Bergshamra by beror bland annat på den gamla fastighetsindelningen vilket inneburit stora svårigheter att dra VA-ledningarna på ett kostnadseffektivt sätt. De reglerbara mängderna har varit höga och det har varit kostnader på grund av markföroreningar och tillfällig pumpning av grundvatten under anläggningsarbetena. Att upprätta alla nyttjanderättsavtalen tog också lång tid vilket innebar förseningar i projektet ett halvår och därmed stilleståndsersättningar.

4.3 Hela Bergshamraprojektet

Kostnaden för hela Bergshamraprojektet 12012 är 232 000tkr och budgeten uppgick till 224 000tkr. Vilket innebär ett överskridande på ca 3%.



Totala kostnaden för Bergshamraprojektet 2021-08-31

	Objekt	Kostnad	Prognos/budget KF-beslut 2019	Avvikelse %
Utredning Bergshamra/överföringsledning	4233	59 947 978		
Förnyelse av VA-ledningar		8 130 035		
Pst ÅN	4237	616 542		
Totalt Utredning /överföringsledningar (projekt 3 och 4)		68 694 555	59 423 000	16
Bergshamra centralt (projekt 5)	4240	16 555 408	15 488 000	7
Enviken	4234	80 116 489		
TS Enviken	4241	1 313 466		
Totalt Enviken (projekt 1)		81 429 955	81 892 000	-1
Bergshamra by	4239	63 775 124		
Pst Bergshamra by	4754	1 017 500		
Pst Rörmossen	4756	616 000		
Totalt Bergshamra by (projekt 2)		65 408 624	68 127 000	-4
Totalt Bergshamraprojektet		232 088 541	224 930 000	3

Tabell 5. Kostnad hela Bergshamraprojektet

5 Måluppfyllelse

Målet för projektet har varit att ansluta de fastigheter som låg i inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp enligt beslut i KF 7 maj 2012 §101.



6 Övriga förutsättningar

Projektet påbörjades 2012 och under dessa 10 år projektet har pågått har många personer deltagit i det samlade projektet ”VA-utbyggnaden i Bergshamra”. Även i de olika delprojekten har många projektledare medverkat men de har avslutat sina uppdrag i detta projekt då de slutat sina anställningar eller bytt arbetsuppgifter.

Bergshamraprojektet var en del av den VA-utvecklingsplan som antagits av kommunfullmäktige 2012 och denna plan var allt för ambitiös och i viss utsträckning inte genomförbar varför den upphävdes 2015.

7 Vunna erfarenheter

Bergshamraprojektet (projekt 12012) var när det beslutades 2012 det största investeringsprojekt inom VA-verksamheten någonsin. För att genomföra ett projekt av denna storlek krävs en sammanhållen projektorganisation och även en tydlig styrning från beställaren. Detta har inte funnits under dessa 10 år. De underlag som förelåg vid beslutet om att genomföra projektet var i stor utsträckning bristfälligt och de underliggande ekonomiska kalkylerna var otillräckliga.

För att genomföra ett projekt i denna storleksordning som både är komplext och förenat med stora kostnader samt risker måste det föregås av noggranna förstudier där såväl ekonomi, teknik och miljömässiga aspekter utreds. Det behövs också en beställarorganisation som följer upp helheten och fortlöpande utvärderar det arbete som genomförs. En projektorganisation måste också finnas med kompetenser som behövs för att genomföra ett projekt av denna storleksordning. Bra är om projektorganisationen kan hållas intakt i största möjliga mån under projekttiden.

Projektet Bergshamra by övertog ett pågående projekt att bygga en ny tryckstegringsstation. Arbetet hade muntligt beställts av SVEAB av driftorganisationen. Dokumentation saknades över vad som skulle göras. Projektet har färdigställt arbetet med hjälp av Sveab. Ingen slutbesiktning är gjord. En särskild besiktning har gjorts i juni 2021 där man kunde konstatera att anläggningen var färdigställd och fungerade som det var avsett. I framtida projekt är det viktigt att ordentlig dokumentation sker av allt arbete och tydliga överlämningar sker vid övertaganden och överlämnande av projekt samt färdiga anläggningar.

VA-ledningsnätet inom Bergshamra by ligger i stor utsträckning på tomtmark. Området ligger utanför detaljplanerat område med gammal bebyggelse och tomtindelning. Många fastighetsgränser har inte varit inmätta och detta har inneburit många problem vid projekteringen och särskilt vid anläggningsarbetena. Utbyggnader



av VA-ledningar bör som regel alltid ske i detaljplanerade områden. Vidare måste fastighetsgränserna vara bestämda i möjligaste mån.

De baskartor som funnits har inte visat sig vara riktiga. Av misstag har därför den ena av pumpstationerna byggts på en annan fastighet än vad som var tänkt. Diskussioner pågår för närvarande om att få rådighet över marken där pumpstationen faktiskt står.

Norrtälje kommun har gjort uppdateringar av baskartan men eftersom det saknas avtal mellan Lantmäteriet och Norrtälje kommun avseende utbyte av information om fastighetsgränserna så har Lantmäteriet haft svårigheter att ta del av de uppdaterade baskartorna som Norrtälje kommun tagit fram. I en framtid måste denna fråga lösas med utbyte av information mellan Norrtälje kommun och Lantmäteriet för att VA-arbeten skall kunna utföras korrekt och med bra resultat.

Lantmäteriförrättning pågår för såväl Bergshamra centralt och Bergshamra by och beräknas bli klara under 2022. Samarbetet med Lantmäteriet har fungerat bra.

Sedan bör arbetet med att få rådighet över områden där nya VA-ledningarna prioriteras inledningsvis. Erfarenheten från detta projekt är att det tar lång tid att få till stånd nyttjanderättsavtal med alla ägare till fastigheter och samfälligheter. För att förhindra att fastighetsägarna blir missnöjda är det viktigt att få till stånd en bra löpande dialog med alla berörda fastighetsägare både under samt vid slutbesiktningarna entreprenaden när det färdigställts.
