



VA-avdelningen

Handläggare John Henerud
Titel: Projektledare
E-post: john.henerud@norrtalje.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning av del av Bergshamra överföringsledning

12012 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för objekt Bergshamra överföringsledning mellan Sjöändan och Bergshamra tätort

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12012 objekt 4233, överföringsledning mellan Sjöändan och Bergshamra tätort.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet med nybyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp till området Bergshamra tätort, Bergshamra by och Enviken påbörjades 2014. Byggnationen slutfördes 2016 till en kostnad av 55 639 tkr, vilket är 2 606 tkr lägre än beräknat.

Bakgrund

Projektet utfördes som en del av tidigare VA-plan där många områden skulle anslutas till kommunalt VA. Program för utveckling av kommunalt VA 2010-2030, antogs i KF 26 september 2011 och upphävdes 30 mars 2015.

Kommunfullmäktige beslutade den 5:e maj 2010 att anslå 202 730 tkr för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i utvecklingsområdet Bergshamra. Av dessa 202 730 tkr öronmärktes 58 246 tkr för detta projekt, utbyggnad av överföringsledningar till verksamhetsområdena i Bergshamra. Investeringsbeslut: KF 2012-05-07 § 101, DNR: KS 12-567

Slutrapport för den totala investeringen på 202 730 tkr kommer att redovisas när sista delprojektet är slutfört. Hittills i denna investering har delprojektet Enviken VO redovisats till en slutkostnad på 78 895 tkr. Denna slutrapport godkändes i KF 201604040 § 62.

Koppling till gällande styrdokument

VA-plan, beslutad 2017-02-13.

Lagkrav

Är inte tillämplig.


Samberedning

Ärendet har beretts med ekonomiavdelningen.



Beskrivning av ärendet

Överföringsledningarna leder spillvatten från Enviken som är färdigutbyggt sedan 2016, Bergshamra tätort, som varit utbyggt sedan länge, men kompletterats med ett 20-tal fastigheter i år, samt Bergshamra by som byggs ut i detta nu. Spillvattnet pumpas hela vägen till Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje stad. Dessa områden förses nu även med vatten från Norrvatten istället för att använda de lokala vattenverken som ej levererat kvalitativt dricksvatten de senaste åren i bruk.

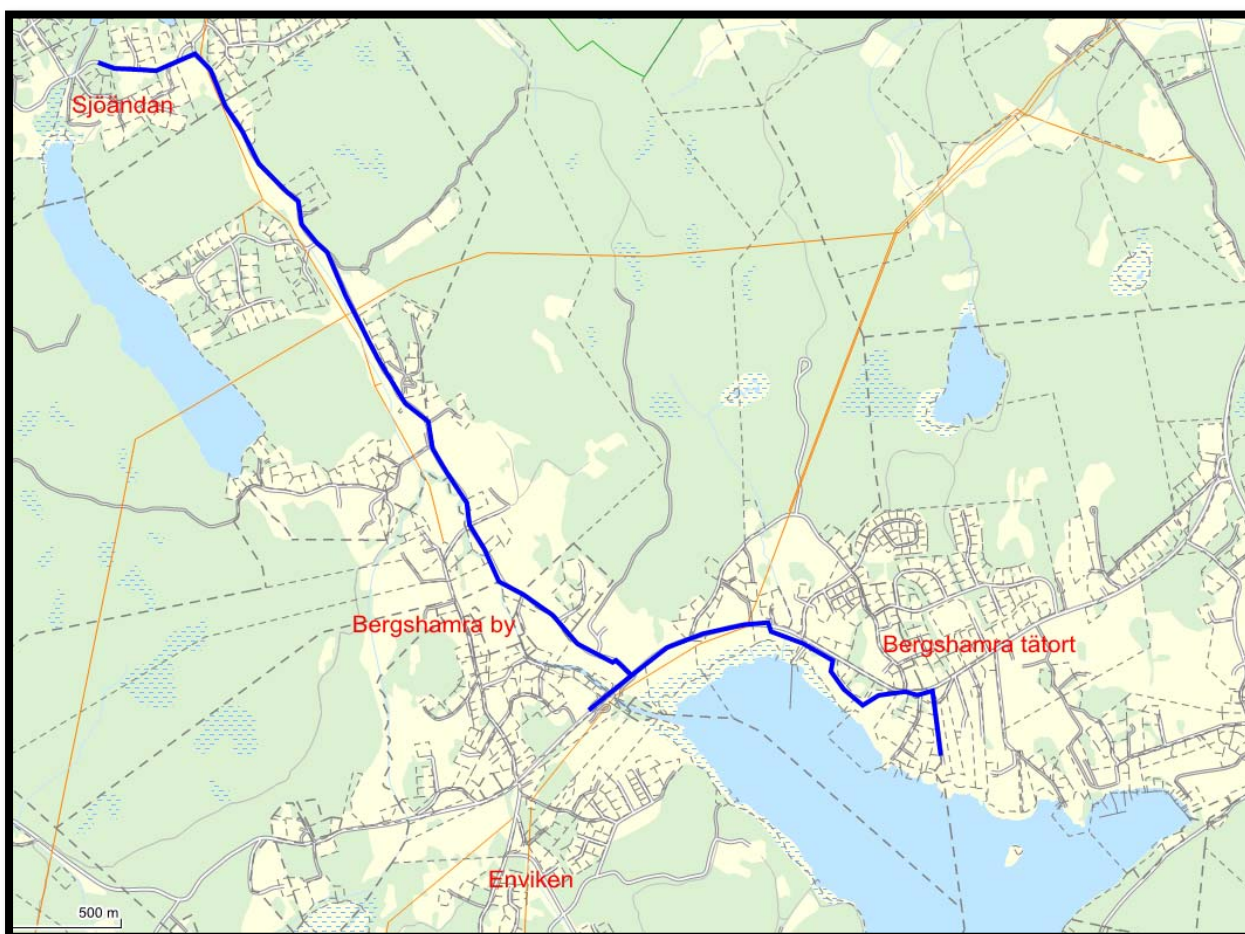

Sträckan är ca 5355 m och sträcker sig från Sjöandan till Enviken och Bergshamra tätort.

Entreprenaden genomfördes i samarbetsformen utökad samverkan tillsammans med anläggningsföretaget SVEAB, Svenska entreprenad i Mälardalen AB.

Kostnaderna i detta projekt är 55 638 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.



Investeringsutgifter tkr

| VA | Kalkyl | Utfall | Tot. Diff. |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Projektering | 1 280 | 498 | 782 |
| Byggledning | 1 280 | 982 | 298 |
| Marklösen | 1 210 | 1 308 | - 98 |
| Projektledning | - | 1 500 | - 1 500 |
| Byggkostnad | 42 827 | 42 954 | - 127 |
| Oförutsett | 11 649 | 8 396 | 3 253 |
| Totalt | 58 246 | 55 638 | 2 608 |

lanspråktagande av investering skedde 2015 direkt efter godkänd slutbesiktning då tillgången till vatten från det lokala vattenverket var för dålig. Först ledde man fram vatten från Nånö vattenverk via norrvattenledningen och så snart tryckstegringsstationen i Sjöändan blev färdigställd levererades vatten från Görväln i Järfälla. Bergshamra blev därmed först ut att börja använda Norrvattens vatten.

Investeringsinkomster tkr

Inga intäkter kan direkt knytas till överföringsledningarna. Intäkterna kommer i verksamhetsområdena Bergshamra By, Enviken och Bergshamra tätort.

Konsekvensanalys/riskanalys

Är inte tillämpligt.

Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämpligt.

Ekonomisk analys

Slutkostnaden för detta projekt hamnade på 2,6 miljoner kronor under budget.

Jämställdhetsanalys

Är inte tillämpligt.

Äldre- och tillgänglighetsanalys

Är inte tillämpligt.

Tidplaner

Är inte tillämpligt.



Charlotte Köhler
Avdelningschef/titel
Samhällsbyggnadsavdelningen

Anders Gelande
VA-chef
Samhällsbyggnadsavdelningen

Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen
VA-avdelningen
Handläggare
